




RALMONT[®]
Dichtungssysteme

FBA complete

Bestellformular

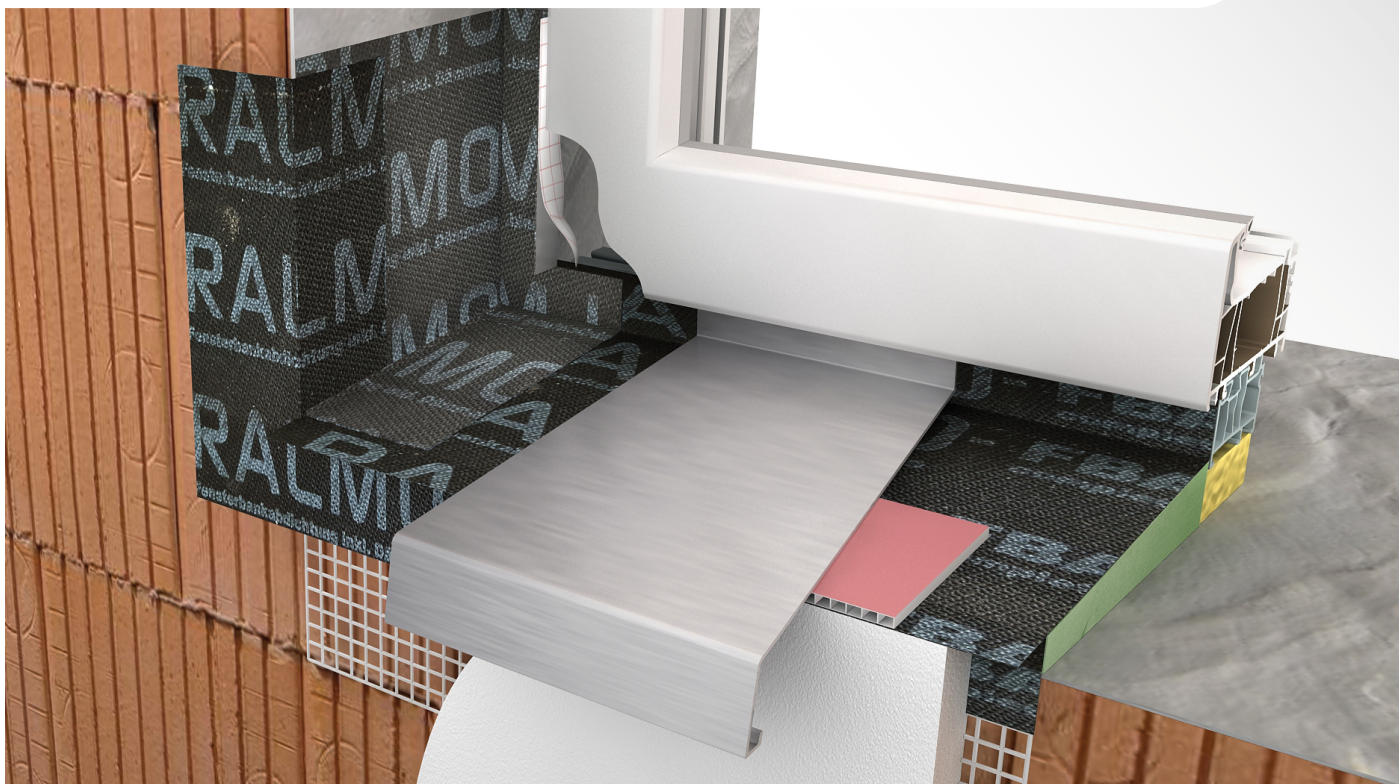

Datum: _____

Besteller / Rechnungsadresse:

Lieferadresse:

Kommission: _____

Versandoptionen:

Standard
3 bis 4 Arbeitstage nach Fertigung


Express
zzgl. Expresskosten

gewünschter Liefertermin: _____


So gehen Sie vor:

1. Anschluss vorne wählen


Selbstklebung

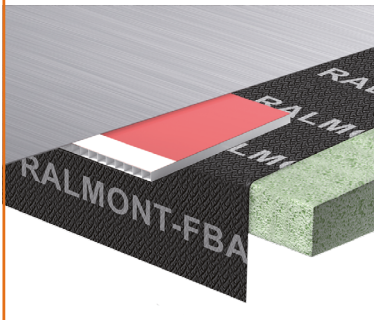


Putzgewebe

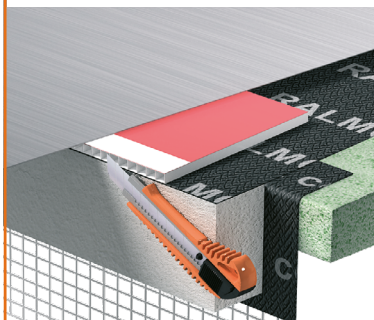

Synthesa Sohlbank-Profil

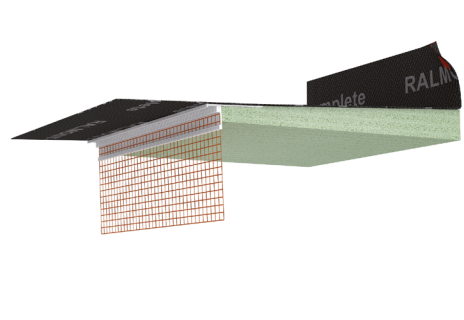

2. Ausladung sowie hintere Höhe bestimmen

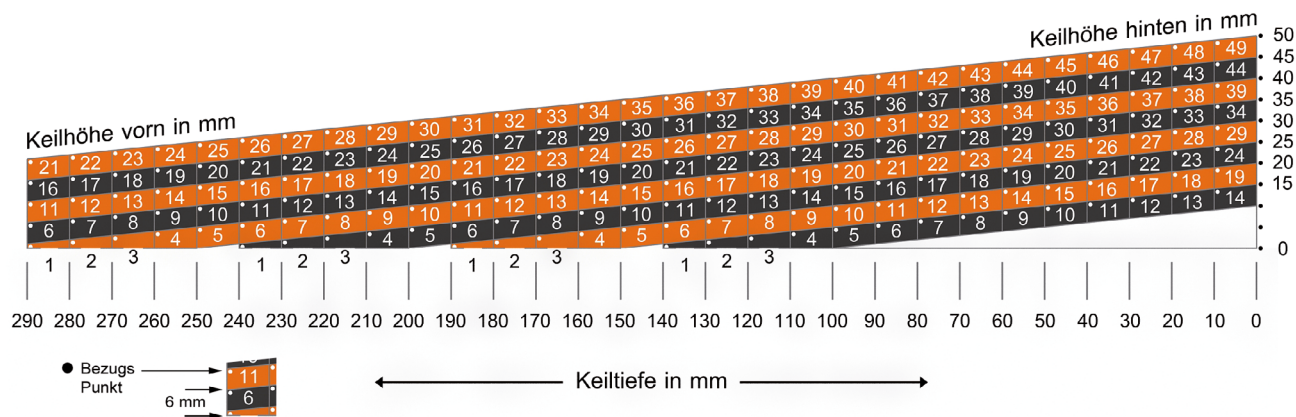

Bitte tragen Sie die Vermaungen fr Ihre individuelle Bestellung vom FBA complete ein.

Wir bentigen unbedingt das Ma hinten am Keil und die Ausladung.
Alle Keile werden 5° schrg geliefert.


3. Unterscriben an Ihren Ansprechpartner

Modell 1:

entweder mit Selbstklebung vorne

oder mit Putzgewebe

mit wasserführender Folie

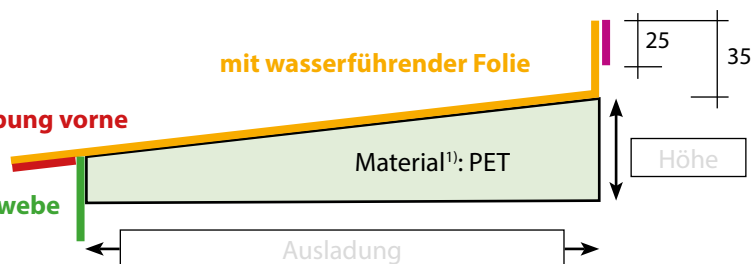

Anzahl: _____ Stangen je 2,6 m

Selbstklebung vorne

Putzgewebe

Synthesa Sohlbank-Profil



Zubehör

- | | | |
|---|--|------|
| 1 Hinterlüftungsprofil | ja | nein |
| 2 Folienkleber grau | ja | nein |
| 3 Reparaturband zum Verkleben von Stößen | ja | nein |
| 4 Anzahl der FBA-Montageecken | _____ Stk. Ecken links _____ Stk. Ecken rechts mit Vlies schwarz und Selbstklebung Butyl | |
| 5 Sprühprimer (für FBA-Montageecken) | _____ Stk. | |

Lieferoptionen

Stangen zusammen geklappt auf 1,3 m,
Folie ist durchgehend

Stangenware nicht geklappt (erhöhte Frachtkosten)
2,6 m

Angaben und Bemaßung sind korrekt und können so gefertigt werden

Datum: _____


Unterschrift Kunde: _____

Hinweis bei Bestellung: Kein Rückgaberecht, da Sonderanfertigung!

¹): Standard-Material PET; weitere Materialien verfügbar: Kork, Purenit, EPS, Steinwolle (A1)

Alle Angaben in mm

Modell 2:

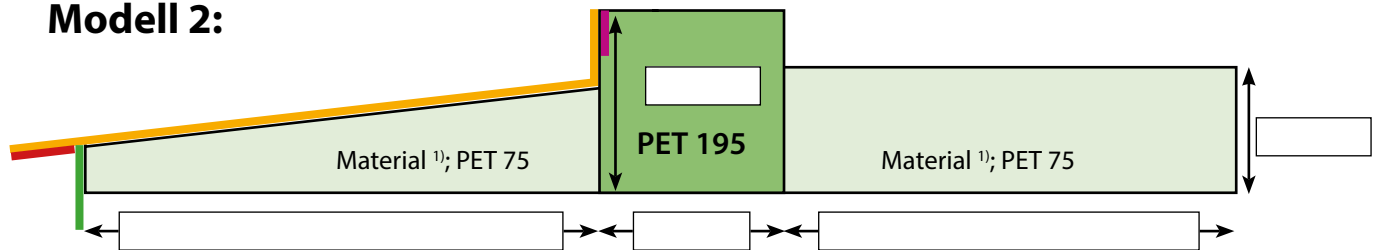

Anzahl: _____ Stangen mit 2,4 m (produktionsbedingt 2,4 m statt 2,6 m)

Selbstklebung vorne

Putzgewebe

Syntheso Sohlbank-Profil



Zubehör

- | | | |
|---|-------------------------|------|
| 1 Hinterlüftungsprofil | ja | nein |
| 2 Folienkleber grau | ja | nein |
| 3 Reparaturband | ja | nein |
| zum Verkleben von Stößen | | |
| 4 Anzahl der FBA-Montageecken | | |
| _____ Stk. Ecken links | _____ Stk. Ecken rechts | |
| mit Vlies schwarz und Selbstklebung Butyl | | |
| 5 Sprühprimer (für FBA-Montageecken) | _____ Stk. | |

Lieferoptionen

Stangen zusammen geklappt auf 1,3 m,
Folie ist durchgehend

Stangenware nicht geklappt (erhöhte Frachtkosten)
2,6 m

Angaben und Bemaßung sind korrekt und können so gefertigt werden

Datum: _____

Unterschrift Kunde: _____

Hinweis bei Bestellung: Kein Rückgaberecht, da Sonderanfertigung!

¹⁾: Standard-Material PET; weitere Materialien verfügbar: Kork, Purenit, EPS, Steinwolle (A1)

Alle Angaben in mm

Bei der Planung müssen folgende Punkte beachtet werden:

1. Berechnungsbeispiel:

Ausladung Fensterblech 165 mm

H) Dämmkeiltiefe (zzgl. Putzdicke beachten)
ca. 125 mm

ca. 125 mm

Vorsprung Fensterblech zum fertigen Putz
mind. 40 mm

Folientiefe ist ca. 70 mm tiefer als Dämmkeil, ca. 195 mm Folientiefe. Überstand wird abgeschnitten

H) 125 mm Dämmkeiltiefe

2. Verfügbare Höhe beim Keil hinten:

H) bei 125 mm Dämmkeiltiefe

C) 40 mm bis 50 mm Sohlbank (ideale Höhe)

E) + 20 mm Montagefuge

D) + 2-4 mm Luft

A) = 62 (64) mm verfügbare Höhe

3. Ermittlung Dämmkeilhöhe, hinten bei 62 mm:

A) 62 (64) mm verfügbare Höhe

F) -25 mm (Höhe Fensterblech incl. Abschluss)


D) -2 mm bis 4 mm Luft

G) = 25 (23) mm Höhe Dämmkeil hinten

Die Höhe vom Fensterblech Abschluss muss bekannt sein!

Z.B. RALMO®-Gleitabschluss hat 25 mm,

RAG-Abschluss hat 35 mm mit Dichtgummi oben

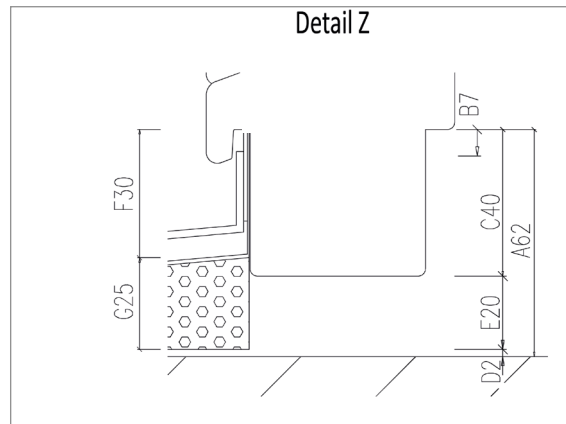

Sonderanfertigung: bitte einzeichnen und bemaßen
